


Bestuurlijke voortgangsrapportage 2025-H1

Water in Balans januari 2025 – juni 2025

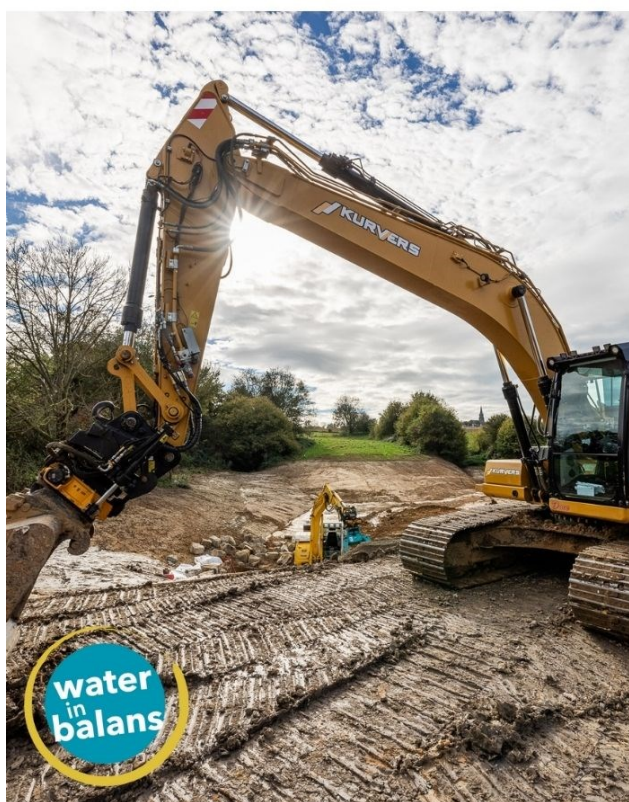

Titel Bestuurlijke voortgangsrapportage 2025-H1
Subtitel Water in Balans januari 2025 - juni 2025
Datum 1 juli 2025
Versie 2
Status Concept
zaaknr. 2025-Z7588
documentnr. WLDOC-950963424-3392

Bezoekadres

Maria Theresialaan 99
6043 CX Roermond

Postadres

Postbus 2207
6040 CC Roermond

IBAN: NL10NWAB0636750906

KvK: 67682065

088 88 90 100

info@waterschaplimburg.nl

www.waterschaplimburg.nl

vrijgave Dit document is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van en in samenwerking met:

naam	functie
Kernteam Water in Balans o.l.v.	
Marco Luijten	

Rol

Programmamanager WiB

Dit document is vrijgegeven door: Marco Luijten

Inhoudsopgave

1	Inleiding	4
1.1	Positie van het programma	4
1.2	Leeswijzer	4
2	Management samenvatting	5
2.1	Dashboard	5
2.2	Financiën t.o.v. P&C Cyclus	7
2.3	Risico's	8
3	Stand van zaken Programma Water in Balans	10
3.1	Programma management	10
3.2	Verkenningen & Planuitwerkingen	12
3.3	Realisatie	13
3.4	Omgevingsmanagement	13
3.5	Projectbeheersing	15
3.5.1.	Financiën	15
3.5.2.	Planning	16
3.5.3.	Risicomanagement	21
3.5.4.	Kwaliteit	21
4	Projecten Water in Balans	22
5	Bijlage	26
	Bijlage A: Prognose 2025-2030	26

1 Inleiding

1.1 Positie van het programma

Deze rapportage geeft inzicht in de voortgang van het programma *Water in Balans* (WiB). Het document is opgesteld op basis van input van het volledige team, waaronder de zes regioteams en het kernteam. Dit resulteert in een compleet beeld van de voortgang en status van het programma. Peildatum voor deze rapportage is 1 juli 2025.

De Planning & Control (P&C) cyclus van Waterschap Limburg bestaat uit de Kadernota, Begroting, Voorjaarsrapportage, Najaarsrapportage en Jaarrekening. In deze rapportage wordt de financiële stand van zaken vergeleken met de Voorjaarsrapportage 2025.

1.2 Leeswijzer

Na de inleiding (hoofdstuk 1) volgt in hoofdstuk 2 de managementsamenvatting. Hierin wordt ingegaan op de projectstatus, het financiële overzicht op programmaniveau (in relatie tot de P&C-cyclus) en de risicoanalyse.

Hoofdstuk 3 beschrijft de ontwikkelingen in de rapportageperiode aan de hand van het IPM-model (Integraal Projectmanagement). Vervolgens zoomt Hoofdstuk 4 in op de voortgang van de individuele projecten.

Daarbij wordt gebruikgemaakt van een projectendashboard met kleurcoderingen. Ontbreekt een kleur, dan betekent dit dat het project nog niet is gestart of dat het onderdeel niet van toepassing is. Het is mogelijk dat een project op een specifiek onderdeel aandacht vereist (score oranje), maar dat het overall als 'geen bijzonderheden' wordt beoordeeld (score groen).

Deze rapportage richt zich op afwijkingen ten opzichte van de vorige Bestuurlijke Voortgangsrapportage. Verschuivingen in de planning zijn opgenomen in paragraaf 3.7.2, in vergelijking met de baselineplanning.

	Overall	Financieel	Planning	Kwaliteit	Risico's	Omgeving	Grond
	Geen bijzonderheden	Tot 105% van budget	Tot 3 maanden overschrijding.	Conform eisen	Onder controle	Voldoende participatie / geen klachten	Geen bijzonderheden
	Aandacht vereist	Tot 110% van budget	Groter dan 3 maanden overschrijding.	Binnen budget / planning te herstellen	Onvoldoende benoemd / opgevolgd	Weinig participatie / enkele klachten	Verwerving moeizaam
	Actie vereist	> 110% van budget	Groter dan 6 maanden overschrijding.	Oorzaak voor aanpassing budget of planning	Niet in beeld, onvoorziene risico's treden op	Zeer weinig participatie / veel klachten	Verwerving oorzaak voor aanpassing budget of planning

Tenslotte is als bijlage de prognose 2025 en verder opgenomen.

2 Management samenvatting

2.1 Dashboard

Onderstaand dashboard van de tranche 1 en 2 projecten geeft de stand van zaken en evt. afwijkingen weer ten opzichte van de vorige Bestuurlijke Voortgangsrapportage. Tranche 3 projecten zijn hier niet in opgenomen daar deze opvolgend zijn geprogrammeerd en nog niet zijn opgestart.

24-H2 – Bestuurlijke Voortgangsrapportage **H2-2024** (periode juli 2024 – december 2024)

25-H1 – Bestuurlijke Voortgangsrapportage **H1-2025** (periode januari 2025 – juni 2025)

Project	Overall		Financieel		Planning		Kwaliteit		Risico's		Omgeving		Grond	
	24-H2	25-H1	24-H2	25-H1	24-H2	25-H1	24-H2	25-H1	24-H2	25-H1	24-H2	25-H1	24-H2	25-H1
WiB-Beek & Spaubeek														
WiB-Bocholtz & Simpelveld														
WiB-Eckeltsebeek														
WiB-Einighausen														
WiB-Eygelshoven														
WiB-Eys														
WiB-Hegge														
WiB-Hekerbeekdal														
WiB-Lemiers en Oud-Lemiers														
WiB-Mechelderbeekdal														
WiB-Meerssen														
WiB-Noordal														
WiB-Oirsbeek														
WiB-Valkenburg														
WiB-Voerendaal														
WiB-Wijnandsrade / Aalbeek														

Bron: Project beheersen 2024-Z594 “[Dashboard voortgangsrapportage](#)”

Voor de actuele faseplanning van alle WiB projecten, zie hoofdstuk 3.7.2.

Bijzonderheden:


WiB-Beek & Spaubeek		Het project bevindt zich in de verkenningsfase. De input van bewoners, agrariërs en andere betrokkenen is verwerkt. De gewenste grondposities zijn in beeld gebracht. In samenwerking met de afdeling grondzaken worden de eerste verkennende gesprekken gevoerd. Het project werkt toe naar de afronding van het VKV. Dit heeft iets langer geduurd dan gepland vanwege gebrek aan voldoende capaciteit bij het ingenieursbureau.
WiB-Eygelshoven		De voorkeursvarianten voor Eygelshoven Basis en Rimburch zijn vastgesteld. Hiermee is de verkenningsfase van deze projecten afgerond. Gestart is met de planuitwerkingsfase. Zo wordt onder andere de uitvraag voorbereid voor het ingenieursbureau voor de planuitwerking. Op basis van de inzichten behorende bij de VKV's is de realisatiefase opnieuw gepland met een langere (totale) doorlooptijd van ca. 2 jaar.
WiB-Eys		De voorkeursvariant is vastgesteld. Gestart is met de planuitwerkingsfase. De gunning van de ingenieursdiensten bevindt zich in de afrondende fase. Risico's worden momenteel gezien in het mogelijk benodigde jaarrond ecologisch onderzoek, het verkrijgen van de benodigde vergunningen en de bijbehorende procedures. Bovengenoemde onzekerheden maken dat de planuitwerkingsfase ± 6 maanden langere doorlooptijd heeft.
WiB-Hekerbeekdal		De realisatie van het project staat gepland voor 2026. De samenwerking met het ingenieursbureau verloopt moeizaam en uit verdiepende onderzoeken zijn nieuwe inzichten naar voren gekomen die leiden tot aanpassingen in het definitieve ontwerp (DO). Beide ontwikkelingen hebben invloed op de voortgang. In de komende periode worden de effecten hiervan meegenomen in de ecologische onderzoeken. De vergunningsprocedures en de besteksfase worden herzien en opnieuw ingepland om de wijzigingen en voortgang goed te borgen.
WiB-Meerssen		Fase 2 (groen): De realisatie is gestart en de verwachting is dat de werkzaamheden conform planning in november 2025 gereed zijn. Fase 3 (oranje): De planuitwerkingsfase voor Landgoed Vliek staat voorlopig on hold. De eigenaar van het landgoed wil eerst zekerheid in de vorm van een onherroepelijke vergunning van de gemeente Meerssen en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed voor de ontwikkeling van een hotel. We zijn in gesprek met de eigenaar om dit vlot te trekken. De realisatie van de graften en groenstroken bij Waterval staat gepland voor het najaar van 2025.
WiB-Voerendaal		De vaststelling van de voorkeursvariant voor Voerendaal bevindt zich in de afrondende fase. Hiermee wordt de verkenningsfase van project Voerendaal afgerond met een breed gedragen voorkeursvariant. Vervolgens start de planuitwerkingsfase. Er wordt al gewerkt aan de uitvraag voor het ingenieursbureau

		voor de planuitwerking. Op basis van de inzichten behorende bij het VKV is de realisatiefase opnieuw gepland met een totale doorlooptijd van ca 2 jaar. Naast het hiervoor bedoelde VKV pakket lopen in Voerendaal twee andere projecten, namelijk de voorbereiding van de voorrangsmatregelen en een haalbaarheidsonderzoek naar een eventuele aanleg van een omleiding aan de westelijke zijde van het dorp.
--	--	--

Voor een volledige toelichting over de voortgang van alle WiB projecten, zie hoofdstuk 4.

2.2 Financiën t.o.v. P&C Cyclus

In de eerste helft van 2025 is een bedrag van € 3,9 miljoen gerealiseerd. Dit is 23.3% t.o.v. het geprognostiseerde bedrag in de Voorjaarsrapportage 2025 van 16,7 miljoen. Voor de tweede helft van het jaar wordt nog 10,3 mln. aan uitgaven verwacht, wat in lijn is met de trend van de afgelopen jaren waarin het zwaartepunt van de uitgaven ná de zomer ligt. De prognose voor het einde van het jaar komt daar mee uit op 14,2 mln. wat neerkomt op 85% van de prognose in de Voorjaarsrapportage 2025. In de begroting 2025 was 26,7 mln opgenomen. Dit investeringsbedrag bevat een onjuiste invoer (project specifieke prognoses ten bedrage van € 10 miljoen zijn in de Begroting 2025 niet in mindering gebracht van het algemene budget van KD008 Programmaplan Water in Balans) en is in de Voorjaarsrapportage gecorrigeerd naar 16,7 mln.

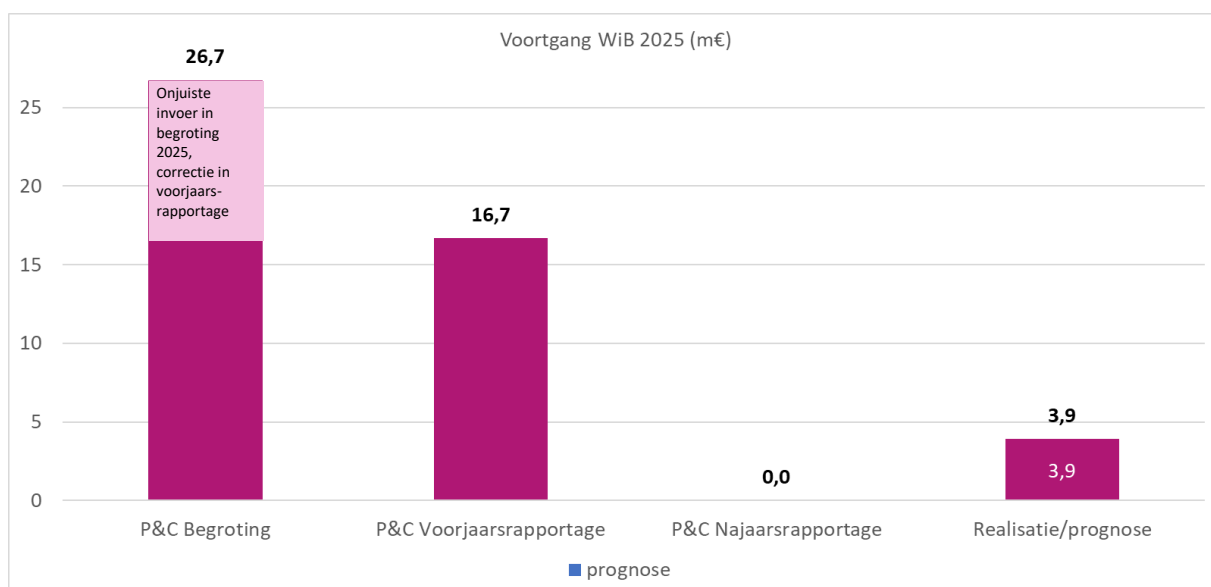

Bron: Project beheersen 2023-Z13407 "[Grafiek ontwikkeling meerjarenbegroting 2022-2030](#)"

2.3 Risico's

Onderstaand de meest actuele top risico's op programmaniveau:

Project Risico ID	Risico	Mogelijke gevolgen en beheersing
PR238	Niet alle benodigde gronden zijn beschikbaar bij de start van de uitvoering.	Gevolg: Dit kan ertoe leiden dat het maatregelpakket niet volledig wordt gerealiseerd of dat het project vertraging oploopt als gevolg van langere verwervingsprocedures of mogelijke dwangprocedures. Beheersmaatregelen: • Start in de verkenningsfase met (minnelijke) gesprekken over grondverwerving. Dit biedt vroegtijdig inzicht in de mogelijkheden om de benodigde percelen voor het voorkeursalternatief te verwerven. • Voer de planuitwerking zo uit dat een mogelijke dwangprocedure kan worden ingezet. Hiermee creëer je een alternatief als minnelijke verwerving niet slaagt. • Zet in op het verwerven van strategische (ruil)gronden waar mogelijk. Dit biedt flexibiliteit voor toekomstige projecten.
PR240	Projecten vallen duurder uit dan initieel geraamd.	Gevolg: Door langere afstemming met stakeholders, beperkte personele capaciteit en stijgende kosten door indexeringen/inflatie, duren projecten langer en worden ze kostbaarder. Hierdoor kan het zijn dat tegen het einde van de looptijd van de huidige scope van het programma keuzes gemaakt moeten worden over het aanpassen/versoberen van de scope dan wel het aanpassen van de beschikbare middelen. Wij zullen hieromtrent afstemmen om dit risico verder te duiden en inzichtelijk te maken. Beheersmaatregelen: • Actualiseer regelmatig de uitgangspunten en kengetallen op basis van de resultaten van projectevaluaties. • Bepaal de benodigde inhuur en pas deze aan op de actuele situatie. • Onderzoek subsidiemogelijkheden en verken cofinanciering met projectpartners.
PR562	Het toepassen van nieuwe procedures en instrumenten	Gevolg: Vertraging van het project.

	van de Omgevingswet kunnen mogelijk vertraging veroorzaken.	Beheersmaatregelen: Onvoorziene situaties worden zoveel mogelijk voorkomen door actief deel te nemen aan kennisdeling en vooroverleg te voeren met de betrokken bevoegde gezagen.
PR568	Beschikbaarheid (capaciteit) en kwaliteitsborging bij het ingenieursbureau.	Gevolg: Vertraging en extra inspanningen om de kwaliteit van de producten te waarborgen. Beheersmaatregel: Definieer de producten duidelijk vooraf en voer tussentijdse kwaliteitschecks uit.

3 Stand van zaken Programma Water in Balans

3.1 Programma management

Algemeen

Waterschap Limburg heeft de uitdaging zich aan te passen aan de klimaatverandering en onder andere te werken aan het verminderen van wateroverlast als gevolg van de klimaatverandering.

Om dit op een gestructureerde, integrale en robuuste wijze én in co-creatie met de omgeving te kunnen doen, is met de vaststelling van het Bestuurlijk programmaplan Water in Balans 2019-2025 (27 november 2019) de basis gelegd voor de eerste tranche van het programma Water in Balans. Met de vaststelling van het werkplan 2022-2025 (9 maart 2022) is vervolgens invulling gegeven aan de tweede tranche van het programma.

Het programma Water in Balans richt zich primair op het realiseren van maatregelen om te voldoen aan de provinciale wateroverlastnormen, met oog voor de ambities uit het Waterbeheerprogramma 2022-2027: gestreefd wordt naar een beschermingsniveau van 1:100 waar dit haalbaar en betaalbaar is. Daar waar mogelijk wordt daarbij rekening gehouden met een integrale aanpak van andere waterdoelen, zoals het verminderen van de verdroging en het vergroten van de ecologische kwaliteit van ons watersysteem.

Op 25 januari 2023 besloot het Algemeen Bestuur (AB) om de derde tranche versneld op te starten, waardoor het programma doorloopt tot en met 2030. Tijdens de begrotingsbehandeling 2025 stelde het AB de benodigde middelen beschikbaar voor de huidige scope van het programma.

Recente watersysteemanalyses, uitgevoerd door de afdeling Waterbeleid, hebben nieuwe wateroverlastknelpunten in beeld gebracht. Een deel hiervan is, vanwege synergievoordelen, opgenomen in de projecten van de tweede en derde tranche en verwerkt in de door het AB vastgestelde begroting 2025. Voor deze projecten zijn dus geen extra middelen nodig.

De vigerende scope van het programma betreft de volgende knelpunten:



Knelpunt:	Huidige fase:
Tranche 1:	
Eckeltsebeek	Gereed
Meerssen Fase 2	Uitvoering
Meerssen Fase 3	Planfase
Oirsbeek Fase 3	Planfase
Hegge	Gereed
Tranche 2:	
Beek en Spaubeek	Verkenningfase
Einighausen	Planfase
Valkenburg (kern)	Planfase

Hekerbeekdal	Planfase
Eys	Planfase
Mechelderbeekdal	Planfase
Lemiers en Oud Lemiers	Planfase
Noordal	Planfase
Bocholtz en Simpelveld	Planfase
Voerendaal	Planfase
Eychelshoven (basis)	Planfase
Rimburg	Planfase
Wijnandsrade - Aalbeek	Planfase
Tranche 3:	
Catsop	Nog op te starten
Quabeeksgrub en Etzenradergrub	Nog op te starten
Kleine en Lange Zouw	Nog op te starten
Valkenburg Fase 3	Nog op te starten
Fromberg - Etenaken	Nog op te starten
Selzerbeek Nijswiller	Nog op te starten

Organisatie

Het programmateam is nu op volle sterkte. In de vorige rapportages gaven we aan dat we meer gingen investeren in contractmanagement. Dat heeft ertoe geleid dat onze contracten met m.n. de ingenieursbureaus beter en strikter worden opgevolgd. Dat werpt z'n vruchten inmiddels af. Door standaardisatie van onze productomschrijvingen en uitvragen kunnen we onze rol als opdrachtgever steeds beter invullen. Verder zijn we afgelopen periode continu in gesprek geweest met het programma Waterveiligheid en Ruimte Limburg (WRL). Daarmee borgen we de onderlinge afstemming tussen de projecten binnen Water in Balans en de studies die WRL uitvoert.

Het Water in Balans-team telt momenteel 34,6 fte. Daarvan is 57,5% in dienst bij het waterschap (54,4% in de tweede helft van 2024) en 42,5% extern ingehuurd (45,6% in H2-2024). De ambitie om minimaal 50% van de formatie intern te bezetten is daarmee gerealiseerd.

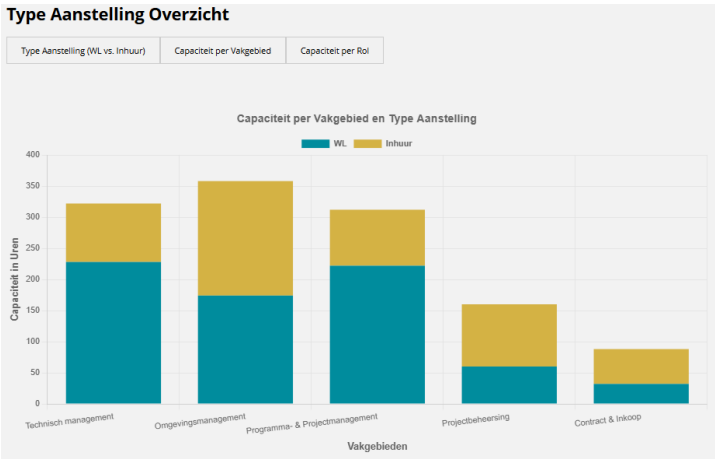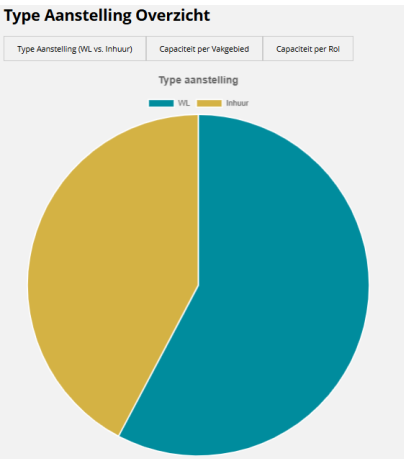

3.2 Verkenningen & Planuitwerkingen

Verkenningen & planuitwerkingen

Het afgelopen half jaar zijn veel verkenningen van projecten uit tranche 2 afgerond. De nog lopende verkenningen worden volgens planning verder uitgewerkt in nauwe samenwerking met gemeenten en andere stakeholders. Voor enkele projecten uit tranche 3 is inmiddels de onderzoeksfase voor de start van de verkenning gestart.

Waar nodig worden programmabreed, samen met het team Waterbeleid, de kaders voor verkenningen aangescherpt. Dit betreft onder meer het gebruik van actuele klimaatscenario's en neerslagcijfers, de zorgplicht voor woningbescherming (knop 4 maatregelen), het benutten van meekoppelkansen zoals droogtebestrijding en waterkwaliteit, de ontwikkeling van de methodiek voor kosten-batenanalyses en de beleidsontwikkeling rond maatregelen op landbouw- en natuurgrond (knop 1 maatregelen).

Daarnaast deelt Water in Balans zijn opgedane ervaringen en werkt het intensief samen met het programma *Waterveiligheid en Ruimte Limburg (WRL)*. De huidige focus ligt daarbij op de Geuldal-verkenning.

Na afronding van een verkenning en vaststelling van de voorkeursvariant, worden de opgenomen maatregelen in de planuitwerkingsfase verder uitgewerkt tot Definitieve Ontwerpen (DO's).

Knop 1 (landelijk gebied)

In de verkenningen en planuitwerkingen van de projecten wordt samen met partners in het landelijk gebied onderzocht welke maatregelen mogelijk zijn om waterafstroming te verminderen. Tijdens bewonersavonden verzorgen we een bemande informatiestand, waar grondeigenaren laagdrempelig advies kunnen krijgen.

In het projectgebied Beek en Spaubeek zijn grondeigenaren in het afstroomgebied daarnaast ook per brief geïnformeerd over de mogelijkheden om waterafstroming te beperken. Voor de uitvoering hiervan zijn diverse subsidieregelingen beschikbaar, waaronder de eigen stimuleringsregeling voor water vasthouden op landbouwpercelen, de provinciale regeling voor landschapselementen en de kansenregeling van WRL. Agrariërs geven aan het erg te waarderen dat dergelijke subsidiemogelijkheden op deze wijze onder de aandacht worden gebracht. Een agrariër uit het gebied heeft vervolgens een aanvraag ingediend voor onze stimuleringsregeling water vasthouden op landbouwpercelen.

Op basis van de door ons opengestelde *Stimuleringsregeling voor water vasthouden op landbouwpercelen in Zuid-Limburg 2025* konden agrariërs van 17 februari tot en met 15 juni 2025 subsidie aanvragen voor maatregelen die extra water vasthouden op hun percelen. Een definitief overzicht van de resultaten is nog niet beschikbaar, maar de eerste signalen over het aantal deelnemers zijn positief.

In dezelfde periode is verder geïnvesteerd in het project *Propositie Heuvelland*. Zo zijn de praktijk- en demonstratieproeven op de proefboerderij in Wijnandsrade opnieuw opgestart in samenwerking met een nieuwe groep agrarische ondernemers. Daarnaast zijn er voorbereidingen getroffen en besluiten genomen om een deel van de geplande activiteiten (bewustwording waterafstroming en waterkwaliteit middels keukentafelgesprekken en ondersteuning bij de uitvoering) van de Propositie uit te voeren.

Ook is een deel van de Propositiemiddelen voor landschapselementen beschikbaar gesteld via de provinciale subsidieregeling *Landschapselementen 2025*, die nog loopt tot december 2025.

Knop 4 (schade beperken aan je eigen woning)

Tijdens bewonersavonden worden demonstraties gegeven van maatregelen die inwoners zelf kunnen treffen om wateroverlast te beperken. Daarbij tonen we onder meer voorbeelden van schotten, die ook te bezichtigen zijn in de Woonwijzerwinkel. Deze demonstraties trekken veel belangstelling.

In samenwerking met het programma Waterveiligheid en Ruimte Limburg (WRL) werken we aan een bredere strategie om het bewustzijn rond zelfbescherming tegen wateroverlast te vergroten. In geselecteerde pilotgebieden in Limburg zijn hiervoor woning- en gebouwscans uitgevoerd, waarmee inzichtelijk wordt gemaakt hoe panden beter beschermd kunnen worden.

3.3 Realisatie

De vervanging van de oeverbeschoeiing langs de Eckeltsebeek is volledig afgerond. Alleen de onderhandelingen met aangrenzende perceeleigenaren over onderhoudspaden lopen nog.

Ook de vergroting van buffer Mamelis is afgerond, inclusief alle restwerkzaamheden.

In Hegge zijn de werkzaamheden aan de Dijkervloedgraaf afgerond en is buffer Hegge aangelegd. Daarnaast is, dankzij de medewerking van perceeleigenaren, besloten om de maatregelen bij de kruising met de Eyskensweg alsnog te realiseren. Dit betreft de aanleg van twee nieuwe waterlopen en een duiker onder de weg. De uitvoering van deze maatregelen zal naar verwachting starten na de bouwvak.

Meerssen Fase 2 is gegund aan een aannemer, die inmiddels is gestart met de werkzaamheden. De afronding wordt verwacht vóór het einde van 2025.

In het voorjaar zijn opnieuw delen van de bufferdam van buffer Watervalderbeek afgeschoven, nadat eerder al reparaties waren uitgevoerd aan deze regenwaterbuffer na het bezwijken in 2021. Het uitvoeringsteam werkt momenteel aan een noodoplossing voor het verzakte talud, terwijl voorbereidingsteam 3 een permanente oplossing uitwerkt.

Dankzij goede afstemming met het team Onderhoud en de beheerorganisatie zijn de buffers van het project aan de Lange Gracht in juni soepel overgedragen aan de beheerorganisatie.

3.4 Omgevingsmanagement

Algemeen

In het afgelopen halfjaar zijn meerdere projecten gestart met de planuitwerking. Bij de start van deze fase zal de omgeving hiervan weinig merken. Het omgevingsmanagement is in deze fase vooral intern gericht, om producten en processen goed af te stemmen op zowel project als omgeving.

Bij projecten die al eerder in de planuitwerking zaten, richt het omgevingsmanagement zich vooral op het laagdrempelig betrekken van direct betrokkenen. Hiervoor worden middelen ingezet zoals

keukentafelgesprekken, waterwandelingen en inloopmiddagen, zodat de omgeving kennis kan nemen van de ontwerpen en feedback kan geven.

Een belangrijk onderdeel van deze fase is het uitvoeren van de conditionerende onderzoeken. Hierbij worden de effecten van de projecten in kaart gebracht, zoals flora en fauna, stikstof en archeologie, om inzicht te krijgen in de mogelijke gevolgen van een project. De uitkomsten kunnen invloed hebben op de fasering of vereisen aanpassingen in het ontwerp. Deze uitkomsten worden meegenomen richting het definitief ontwerp. Voor de projecten die verder in de planuitwerking zijn, wordt gewerkt aan de vergunbaarheid. Voor de eerste projecten of voormaatsregelen worden vergunningen aangevraagd om de uitvoering mogelijk te maken, in samenwerking met gemeenten en de provincie Limburg. Dit proces is complex, met verschillende belangen en verantwoordelijkheden van diverse partijen.

Grondzaken

Uitgangspunt voor onze grondverwerving is minnelijke verwerving. Per 19 juni 2025 zijn 177 grond dossiers in behandeling. Voor 62 dossiers zitten we in de eerste gespreksfase. Voor de overige 111 dossiers verwachten we een minnelijke verwerving. De trend laat zien dat de kosten voor grondverwerving stijgen.

Communicatie

In het afgelopen halfjaar hebben we opnieuw actief ingezet op het informeren en betrekken van de omgeving bij onze projecten. Door middel van bewonersavonden, nieuwsbrieven, persberichten en ons platform Met elkaar hielden we inwoners en samenwerkingspartners op de hoogte van de voortgang.

Bewonersbijeenkomsten en participatie

We organiseerden diverse bewonersbijeenkomsten, onder andere in Meerssen, Eygelshoven, Eys, Valkenburg en Wijnandsrade. Tijdens deze bijeenkomsten gingen we in gesprek over de geplande maatregelen, deelden we projectupdates en beantwoordden we vragen. De bijeenkomsten zijn vaak georganiseerd in samenwerking met gemeenten en collega-programma's zoals Waterveiligheid en Ruimte Limburg. Daarnaast is de informatie op Met elkaar regelmatig geactualiseerd.

Aandacht voor de stimuleringsregeling water vasthouden op landbouwpercelen

De stimuleringsregeling voor agrariërs om water langer vast te houden op hun percelen is dit halfjaar gelanceerd. We besteedden hier actief aandacht aan via een persbericht, sociale media, flyers en banners. Ook tijdens bijeenkomsten brachten we de regeling onder de aandacht. Meerdere media pakten het nieuws op, waarmee de regeling een breed publiek bereikte.

Voorlichting en bewustwording

De pagina over het programma Water in Balans op onze website is aangepast en uitgebreid. Ook ontwikkelden we nieuwe visuals en banners (bijvoorbeeld voor knop 4), en pasten we bestaande communicatiemiddelen aan. Door continu te investeren in toegankelijke en actuele informatie blijven we bewustwording en betrokkenheid stimuleren.

Zichtbaarheid

We droegen bij aan meerdere (interne en externe) campagnes. Zo stond Water in Balans goed vertegenwoordigd in de externe nieuwsbrief en in de waterspecial van de gemeente Meerssen. In maart vond een peiling plaats over de Geul in het kader van WRL, deze peiling werd gepubliceerd op Met elkaar.


Met deze activiteiten versterken we het draagvlak voor onze maatregelen en blijven we bouwen aan het vertrouwen van bewoners, agrariërs en samenwerkingspartners.

3.5 Projectbeheersing

3.5.1. Financiën

In aanvulling op de voortgang van 2025 (zie paragraaf 2.2), toont de onderstaande grafiek de cumulatieve realisatie en prognose 2025-H1 ten opzichte van de meerjarenbegroting (Begroting 2025).

De cumulatieve realisatie ultimo 1 mei 2025 bedraagt € 34,0 miljoen. De cumulatieve meerjarenprognose voor de periode 2022-2030 bedraagt € 146,8 miljoen in 2030. Hierin zijn de benodigde middelen voor de volledige scope van tranche 1, 2 en 3 projecten opgenomen.

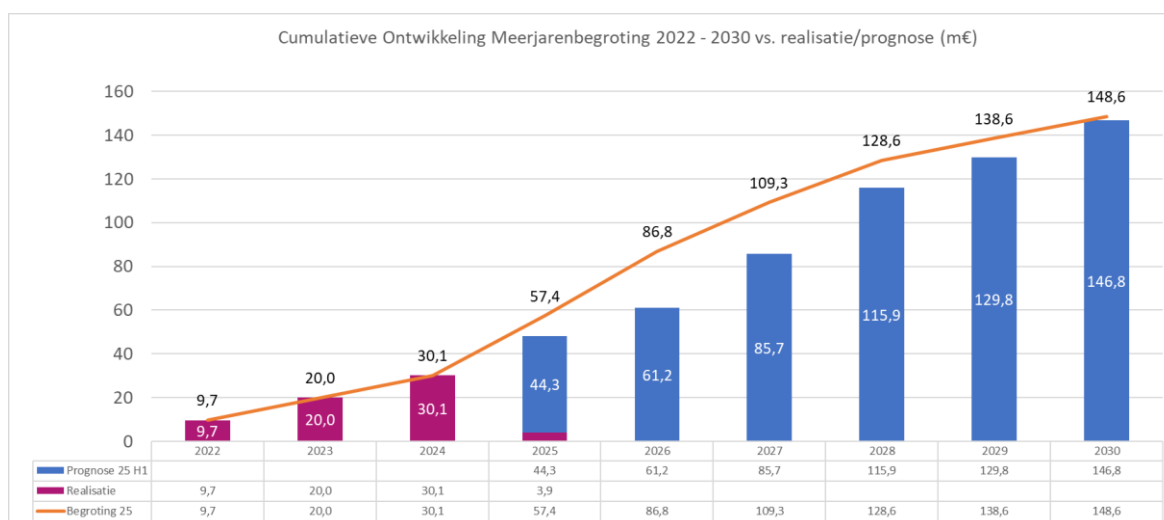

Bron: Project beheersen 2023-Z13407 "[Grafiek ontwikkeling meerjarenbegroting 2022-2030](#)"

Relatie met de Begroting 2025

Bovenstaande grafiek toont de actuele realisatie en prognose ten opzichte van de vastgestelde Begroting 2025 (de baseline). In de Begroting 2025 is € 148,6 miljoen voor de periode 2022-2030 opgenomen voor de tranches 1, 2 en 3. De huidige prognose voor deze periode bedraagt € 146,8 miljoen en is daarmee 1,2% lager.

Op basis van de huidige inzichten met betrekking tot enerzijds het inzetten van cofinanciering door onze stakeholders en anderzijds mogelijkheden tot het verkrijgen van subsidies én gelet op de bandbreedte in onze ramingen en risicovoorzieningen, gaan we op dit moment ervan uit dat de scope gerealiseerd kan worden binnen de in de Begroting 2025 vastgestelde kaders.

3.5.2. Planning

In onderstaande figuren wordt de planning niet alleen weergegeven ten opzichte van de vorige planning 2024-H2, maar tevens ten opzichte van de baseline planning 2023-H2. Dit is de planning die aan de basis ligt voor de (in de Begroting 2025) beschikbaar gestelde middelen.

Bij het opstellen van deze planningen zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

- Projecten welke zich nog in de verkenningsfase of in de onderzoeksfase bevinden hebben vóór de planuitwerkingsfase en de realisatiefase een standaard doorlooptijd voor de verkenningsfase van circa 18 maanden en voor de onderzoeksfase van circa 6 maanden. Aan het einde van de verkenningsfase worden deze doorlooptijden inclusief de financiële gevolgen projectspecifiek geactualiseerd/verwerkt;
- De maatregelen behorende bij het vastgestelde VKV worden in de planuitwerkingsfase als één pakket uitgewerkt waarbij aan het einde van het definitief ontwerp het planologisch spoor (projectbesluit) wordt opgestart;
- Er is geen rekening gehouden met een mogelijke beroepsprocedure in het planologisch spoor. Indien dit optreedt zal de planning herzien worden waarbij een gefaseerde realisatie van maatregelen zal worden onderzocht;
- Alle gronden zijn minnelijk te verwerven. Mocht onteigening onverhoopt aan de orde zijn dan zal hiervoor gedurende de planuitwerkingsfase de onteigeningsprocedure worden opgestart. Indien dit optreedt zal de planning herzien worden waarbij een gefaseerde realisatie van maatregelen zal worden onderzocht.

Onderstaand de actuele WiB Programmaplanning op fase niveau betreffende Tranche 1.

				2024				2025				2026				2027				2028		
Project nr	Projectomschrijving	rap.	datum	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3
Afronding projecten Tranche 1																						
	Noord & midden Limburg					Noord & midden Limburg																
P255901	Gebiedspilot Eckeltsebeek																					
		Baseline 23-H2	31-dec-23																			
		24-H2	31-dec-24																			
		25-H1	1-jul-25																			
	Heuvelland					Heuvelland																
P360044	Gebiedspilot Meerssen F2																					
		Baseline 23-H2	31-dec-23																			
		24-H2	31-dec-24																			
		25-H1	1-jul-25																			
P360044	Gebiedspilot Meerssen F3																					
		Baseline 23-H2	31-dec-23																			
		24-H2	31-dec-24																			
		25-H1	1-jul-25																			
	Parkstad					Parkstad																
P360046	Gebiedspilot Oirsbeek F3																					
		Baseline 23-H2	31-dec-23																			
		24-H2	31-dec-24																			
		25-H1	1-jul-25																			
P360056	Aanpak wateroverlast Hegge																					
		Baseline 23-H2	31-dec-23																			
		24-H2	31-dec-24																			
		25-H1	1-jul-25																			
</																						

Onderstaand de actuele WiB Programmaplanning op fase niveau betreffende Tranche 2 (regio Noord & Midden Limburg en Heuvelland)

Project nr	Projectomschrijving	rap.	datum	2024				2025				2026				2027				2028				2029																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
				Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Projecten Tranche 2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	Noord & midden Limburg				Noord & midden Limburg																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						

Project nr	Projectomschrijving	rap.	datum	2024				2025				2026				2027				2028				2029				
				Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	
Projecten Tranche 2																												
	Parkstad						Parkstad																					
P029402	Bocholtz & Simpelveld	Baseline 23-H2	31-dec-23																									
		24-H2	31-dec-24																									
		25-H1	1-jul-25																									
P090301	Voerendaal	Baseline 23-H2	31-dec-23																									
		24-H2	31-dec-24																									
		25-H1	1-jul-25																									
P057601	Eygelshoven Basis	Baseline 23-H2	31-dec-23																									
		24-H2	31-dec-24																									
		25-H1	1-jul-25																									
P057601	Eygelshoven Rimborg	Baseline 23-H2	31-dec-23																									
		24-H2	31-dec-24																									
		25-H1	1-jul-25																									
P093001	Wijnandsrade - Aalbeek (Hulsbergerbeek - Aalbeek)	Baseline 23-H2	31-dec-23																									
		24-H2	31-dec-24																									
		25-H1	1-jul-25																									
				SO Startbesluit Onderzoeksfase																								
				VO Verkenningopdracht vastgesteld (einde onderzoeksfase)																								
				SV Startbesluit Verkenning																								
				VKV Vastgesteld VKA (einde verkenningsfase)																								
				SP Startbesluit Planuitwerking																								
				EP Einde Planuitwerking																								
				SR Startbesluit Realisatie																								
				UG Uitvoering gereed: opleverdossier geaccepteerd (einde realisatie)																								
				SN Start Nazorg																								
				EN Einde Nazorg																								

Onderstaand de actuele WiB Programmaplanning op fase niveau betreffende Tranche 3.

			2024				2025				2026				2027				2028				2029				2030				2031						
Project nr	Projectomschrijving	rap.	datum	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3			
Projecten Tranche 3																																					
	Noord & midden Limburg			Noord & midden Limburg																																	
	Heuvelland						Heuvelland																														
P119902	Catsop																																				
		Baseline 23-H2	31-dec-23																																		
		24-H2	31-dec-24																																		
		25-H1	1-jul-25																																		
P085301	Quabeeks- en Etzenradergrub																																				
		Baseline 23-H2	31-dec-23																																		
		24-H2	31-dec-24																																		
		25-H1	1-jul-25																																		
ntb02	Kleine & Lange Zouw																																				
		Baseline 23-H2	31-dec-23																																		
		24-H2	31-dec-24																																		
		25-H1	1-jul-25																																		
P021001	Valkenburg F3																																				
		Baseline 23-H2	31-dec-23																																		
		24-H2	31-dec-24																																		
		25-H1	1-jul-25																																		
Parkstad						Parkstad																															
P016902	Fromberg Etenaken (voorheen Baggelsgats & St Gillisstraatlossing)																																				
		Baseline 23-H2	31-dec-23																																		
		24-H2	31-dec-24																																		
		25-H1	1-jul-25																																		
ntb05	Selzerbeek Nijswijler																																				
		Baseline 23-H2	31-dec-23																																		
		24-H2	31-dec-24																																		
		25-H1	1-jul-25																																		

3.5.3. Risicomanagement

De meest actuele risico's op programmaniveau zijn opgenomen in paragraaf 2.3.

Binnen de zes regioteams worden projectrisico's periodiek geïnventariseerd en vastgelegd volgens de RISMAN-methodiek. In de reguliere overlegstructuur van de teams worden de individuele risico's besproken en concrete beheersmaatregelen in de vorm van acties vastgelegd. Op deze manier blijft het risicodossier actueel en inzichtelijk voor alle projectmedewerkers.

3.5.4. Kwaliteit

Het afgelopen halfjaar is verdere vooruitgang geboekt in het uniformeren van werkprocessen. Er zijn inmiddels meerdere formats voor onze producten beschikbaar. Daarnaast stemmen we regelmatig af met collega's van andere teams om elkaar op de hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen.

Met betrekking tot de specificatie van producteisen is er een aanzienlijke vooruitgang geboekt vanuit contractmanagement en projectbeheersing, waardoor toekomstige uitvragen aan ingenieursbureaus duidelijker en eenduidiger zijn.

Daarnaast is een periodiek overleg ingesteld waarin, op basis van het verbeterregister, concrete maatregelen worden besproken en doorgevoerd om de diverse processen te optimaliseren.


4 Projecten Water in Balans

Project		CODA-tekst
WiB-Beek & Spaubeek		Het project bevindt zich in de verkenningsfase. De input van bewoners, agrariërs en andere betrokkenen is verwerkt. De gewenste grondposities zijn in beeld gebracht. In samenwerking met de afdeling grondzaken worden de eerste verkennende gesprekken gevoerd. Het project werkt toe naar de afronding van het VKV. Dit heeft iets langer geduurd dan gepland vanwege gebrek aan voldoende capaciteit bij het ingenieursbureau.
WiB-Bocholtz & Simpelveld		Het project bevindt zich in de planuitwerkingsfase, die inmiddels goed op stoom is. De laatste hand wordt gelegd aan het voorlopig ontwerp. Aansluitend wordt gestart met het opstellen van het definitief ontwerp. In afwachting van de resultaten van de ecologische scan wordt beoordeeld op welke maatregellocaties aanvullend onderzoek nodig is. Dit onderzoek – dat vaak jaarrond plaatsvindt – kan de planning onder druk zetten. Ook is er nog onduidelijkheid over de uitwerking van het planologische proces (Projectbesluit), wat mogelijk leidt tot planningsrisico's. Naar verwachting is hierover eind 2025 meer duidelijkheid.
WiB-Eckeltsebeek		Het project bevindt zich in de nazorgfase en is succesvol opgeleverd. Restpunten, zoals aanvullende beschoeiingen, zijn afgehandeld, met uitzondering van één locatie waar alleen bij laagwater gewerkt kan worden. Het projectteam blijft alert op signalen van onrust bij enkele agrariërs die nog aanpassingen wensen. Op verzoek van het dagelijks bestuur wordt het systeem eerst gedurende een periode gemonitord voordat verdere maatregelen worden overwogen. De omgeving wordt hierbij actief betrokken.
WiB-Einighausen		Het project bevindt zich in de planuitwerkingsfase. De eerder vastgestelde voorkeursvariant is geactualiseerd. De grondverwerving is gestart en verloopt tot nu toe voorspoedig.
WiB-Eygelshoven		De voorkeursvarianten voor Eygelshoven Basis en Rimburch zijn vastgesteld. Hiermee is de verkenningsfase van deze projecten afgerond. Gestart is met de planuitwerkingsfase. Zo wordt onder andere de uitvraag voorbereid voor het ingenieursbureau voor de planuitwerking. Op basis van de inzichten behorende bij de VKV's is de realisatiefase opnieuw gepland met een langere (totale) doorlooptijd van ca 2 jaar.
WiB-Eys		De voorkeursvariant is vastgesteld. Gestart is met de planuitwerkingsfase. De gunning van de ingenieursdiensten bevindt zich in de afrondende fase. Risico's worden momenteel gezien in het mogelijk benodigde jaarrond ecologisch onderzoek, het verkrijgen van de benodigde vergunningen en de bijbehorende procedures. Bovengenoemde onzekerheden maken dat de planuitwerkingsfase ± 6 maanden langere doorlooptijd heeft.

WiB-Hegge		Het project bevindt zich in de nazorgfase. Met de goedkeuring van het laatste grond dossier worden de resterende werkzaamheden uitgevoerd.
WiB-Hekerbeekdal		De realisatie van het project staat gepland voor 2026. De samenwerking met het ingenieursbureau verloopt moeizaam en uit verdiepende onderzoeken zijn nieuwe inzichten naar voren gekomen die leiden tot aanpassingen in het definitieve ontwerp (DO). Beide ontwikkelingen hebben invloed op de voortgang. In de komende periode worden de effecten hiervan meegenomen in de ecologische onderzoeken. De vergunningsprocedures en de besteksfase worden herzien en opnieuw ingepland om de wijzigingen en voortgang goed te borgen.
WiB-Lemiers en Oud-Lemiers		Het project is gestart met de planuitwerkingsfase, waarbij eind mei de gunning aan een ingenieursbureau heeft plaatsgevonden. De voorrangmaatregel Mamelis is afgerond; de overdracht aan de afdeling onderhoud en beheer vindt plaats.
WiB-Mechelderbeekdal		Het project is gestart met de planuitwerkingsfase en verloopt volgens planning. Eind mei is de opdracht gegund aan een ingenieursbureau.
WiB-Meerssen		Fase 2 (groen): De realisatie is gestart en de verwachting is dat de werkzaamheden conform planning november 2025 gereed zijn. Fase 3 (oranje): De planuitwerkingsfase voor Landgoed Vliek staat voorlopig on hold. De eigenaar van het landgoed wil eerst zekerheid in de vorm van een onherroepelijke vergunning van de gemeente Meerssen en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed voor de ontwikkeling van een hotel. We zijn in gesprek met de eigenaar om dit vlot te trekken. De realisatie van de graften en groenstroken bij Waterval staat gepland voor het najaar van 2025.
WiB-Noordal		De brede verkenning wordt geleid door Natuurmonumenten en verloopt volgens planning. De realisatie van de voorrangmaatregel is voorzien voor het najaar van 2025, mits er geen bijzonderheden optreden in het planologisch proces, met name ten aanzien van de benodigde ontheffing op grond van de Natuurbeschermingswet.
WiB-Oirsbeek		De planuitwerkingsfase is in volle gang; de grondverwerving is inmiddels afgerond. De realisatie staat gepland voor de eerste helft van 2026.
WiB-Valkenburg		Voor vier afstroomgebieden wordt een VKV opgesteld, dat binnenkort het bestuurlijke traject doorloopt. In de komende periode wordt tevens gestart met de planuitwerkingsfase. Voor drie afstroomgebieden is nog geen haalbaar maatregelenpakket beschikbaar vanwege omgevingsafhankelijkheden; daarom volgt een aanvullende ontwerpslag.

		De voorrangsmatregelen WiB Valkenburg worden parallel uitgevoerd aan het project Hekerbeekdal.
WiB-Voerendaal		De vaststelling van de voorkeursvariant voor Voerendaal bevindt zich in de afrondende fase. Hiermee wordt de verkenningsfase van project Voerendaal afgerond met een breed gedragen voorkeursvariant. Vervolgens start de planuitwerkingsfase. Er wordt al gewerkt aan de uitvraag voor het ingenieursbureau voor de planuitwerking. Op basis van de inzichten behorende bij het VKV is de realisatiefase opnieuw gepland met een totale doorlooptijd van ca 2 jaar. Naast het hiervoor bedoelde VKV pakket lopen in Voerendaal twee andere projecten, namelijk de voorrangsmatregelen en een haalbaarheidsonderzoek naar een eventuele aanleg van een omleiding aan de westelijke zijde van het dorp.
WiB-Wijnandsrade / Aalbeek		De planuitwerkingsfase is goed op stoom. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan het voorlopig ontwerp, waarna het definitief ontwerp wordt opgesteld. Parallel daaraan wordt gewerkt aan de gunning van de ingenieursdiensten. In afwachting van de resultaten van de ecologische scan wordt per maatregellocatie beoordeeld of aanvullend onderzoek nodig is. Dit onderzoek – vaak jaarrond – kan de planning onder druk zetten. Er is nog onduidelijkheid over de uitwerking van het planologische proces (Projectbesluit) en over de werkzaamheden in en rondom Natura 2000-gebieden, wat aanvullende planningsrisico's met zich meebrengt. Naar verwachting is hierover eind 2025 meer duidelijkheid.

Water in Balans projecten

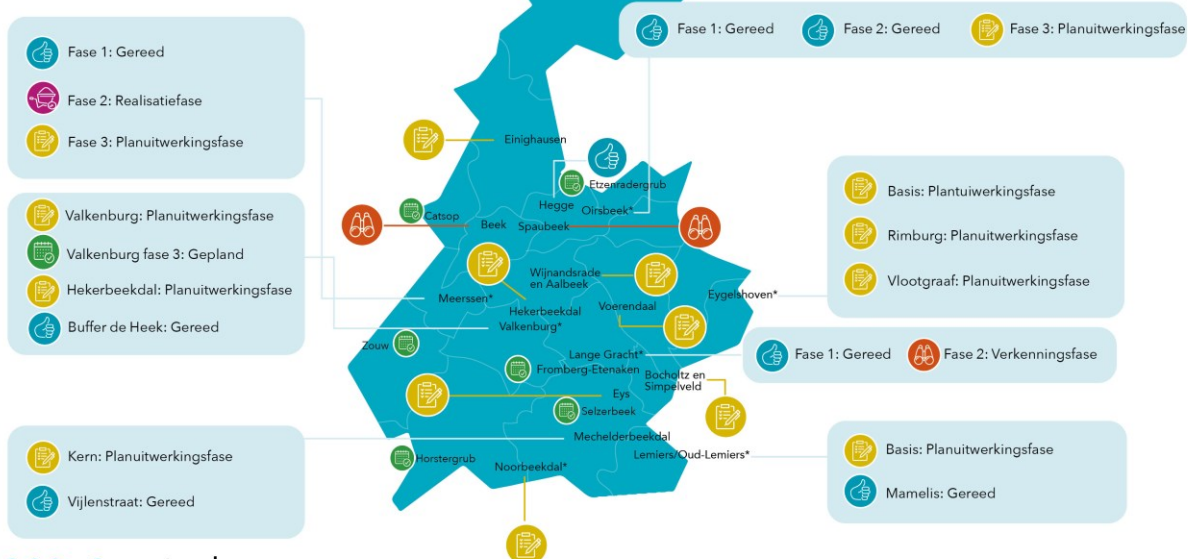

5 Bijlage

Bijlage A: Prognose 2025-2030

	P2025	P2026	P2027	P2028	P2029	P2030	Totaal Prognose
WiB-Algemeen	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250	€ 1.500
WiB-Beek & Spaubeek	€ 555	€ 465	€ 130	€ -	€ -	€ -	€ 1.150
WiB-Bocholtz & Simpelveld	€ 4.667	€ 2.461	€ 5.266	€ 8.882	€ 4.931	€ 827	€ 27.034
WiB-Catsop	€ -	€ 13	€ 232	€ 309	€ 320	€ 261	€ 1.135
WiB-Eckeltsebeek	€ 16	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 16
WiB-Einighausen	€ 267	€ 99	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 366
WiB-Eygelshoven	€ 744	€ 1.488	€ 3.120	€ 3.253	€ 965	€ -	€ 9.570
WiB-Eys	€ 671	€ 1.858	€ 1.198	€ -	€ -	€ -	€ 3.727
WiB-Fromberg-Etenaken	€ -	€ 17	€ 255	€ 309	€ 321	€ 164	€ 1.066
WiB-Hegge	€ 19	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 19
WiB-Hekerbeekdal	€ 279	€ 1.997	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 2.276
WiB-Lange Gracht	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
WiB-Lemiers en Oud-Lemiers	€ 897	€ 949	€ 2.425	€ 2.140	€ 8	€ -	€ 6.419
WiB-Mechelderbeekdal	€ 638	€ 958	€ 2.471	€ 2.768	€ 709	€ -	€ 7.544
WiB-Meerssen	€ 2.195	€ 79	€ 92	€ 22	€ -	€ -	€ 2.388
WiB-Noordal	€ 467	€ 9	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 476
WiB-Oirsbeek	€ 214	€ 48	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 262
WiB-Programmaplan WiB	€ -	€ -	€ 281	€ 656	€ 676	€ 15.500	€ 17.113
WiB-Valkenburg	€ 571	€ 1.743	€ 734	€ 468	€ -	€ -	€ 3.516
WiB-Valkenburg F3	€ 83	€ 544	€ 423	€ 276	€ 81	€ -	€ 1.407
WiB-Voerendaal	€ 656	€ 1.472	€ 3.632	€ 4.849	€ 1.731	€ -	€ 12.340
WiB-Wijnandsrade / Aalbeek	€ 1.001	€ 2.406	€ 3.986	€ 6.069	€ 3.866	€ 40	€ 17.368
Grand Total	€ 14.190	€ 16.856	€ 24.495	€ 30.251	€ 13.858	€ 17.042	€ 116.692
